
Neu-/Umbauten und Sanierungen an Schulen und Sporthallen

Stand Juni 2024

IGS Edemissen



Sanierung Fachunterrichtsräume

Budget: rd. 250.000 €


Baubeginn: Dezember 2024

Fertigstellung: Oktober 2025

Sachstand: Aufgrund der
Kostenexplosion sind noch konkrete
Sanierungskonzepte abzustimmen.

Fördermittel KIP 2

SZ Hohenhameln

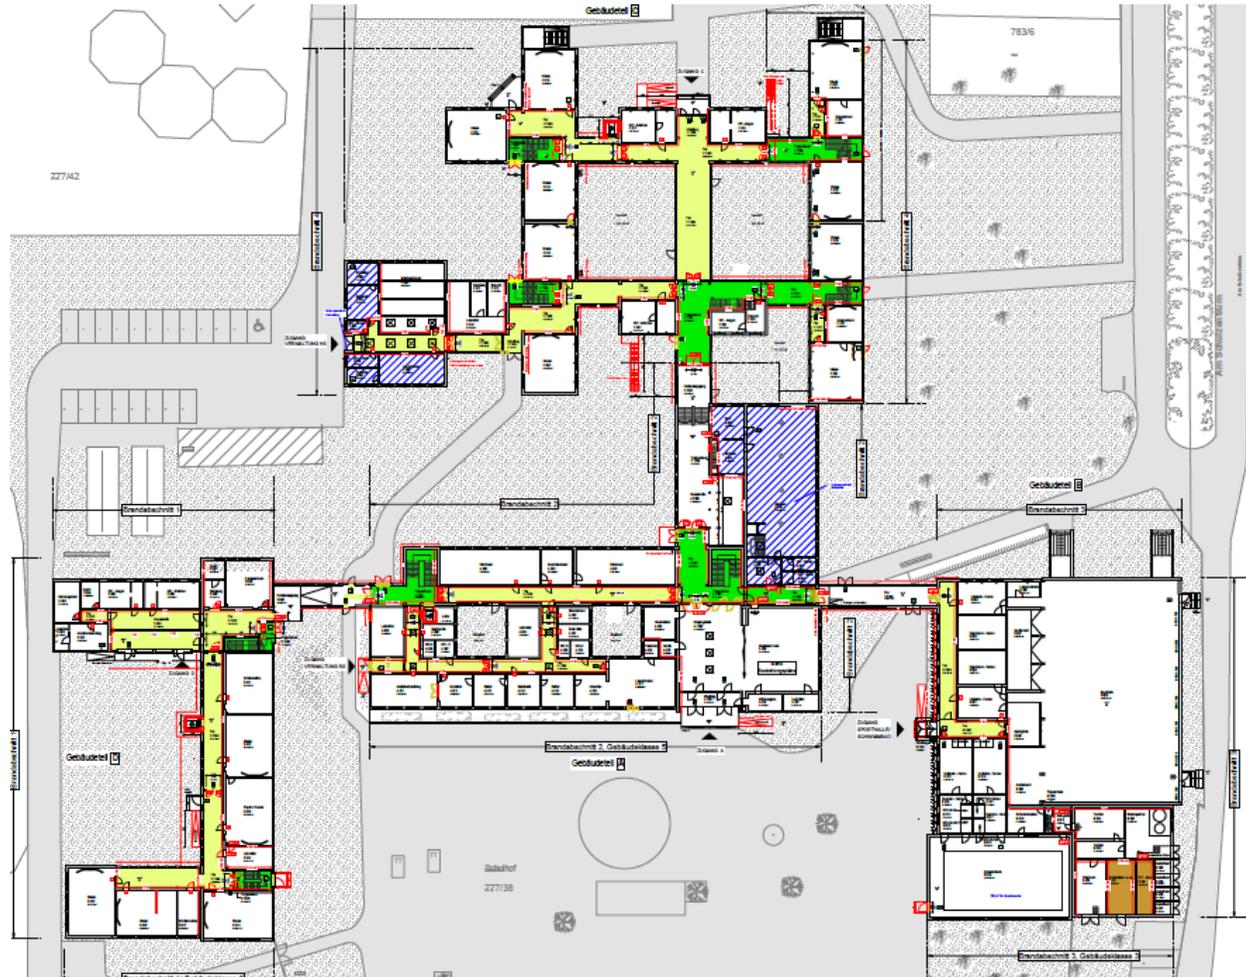

Sanierung Gebäude, Brandschutz und Barrierefreiheit

Budget: aktuell 600.000 €

Baubeginn: 2024

Fertigstellung: ca. 2029

Sachstand: 3. Bauabschnitt
nahezu abgeschlossen,
4. Bauabschnitt in Planung
und Vorbereitung

SZ Ilsede



SZ Ilsede

1. Containeranlage mit 8 AUR

Budget 750.000,-€ Errichtung einer Containeranlage mit acht allgemeinen Unterrichtsräumen im Bereich des Soccerfelds hinter Trakt 0. Die erste Ausschreibung der Containeranlage hat kein Ergebnis gebracht. Die zweite Ausschreibung ist erfolgt, Auftrag ist erteilt. Tiefbauarbeiten sind beauftragt. Die Elektroplanung ist in Arbeit. Der Bauantrag ist gestellt. Ziel weiterhin: Betrieb nach den Sommerferien.

2. Sanierung Sporthalle

Budget 250.000,-€ Behebung der Sicherheitsmängel gemäß Auflagen durch die BSGUV. Hierbei handelt es sich in erster Linie um den Austausch der Geräteraumtore, den Austausch der Türen sowie Herstellung des Prallschutzes. Technische Prüfung und Planung sind abgeschlossen. Die Ausschreibungen sind veröffentlicht. Umsetzung Prellschutz usw. in den Herbstferien, Tore in den Osterferien 25 (Lieferzeit um die 25 Wochen).

3. Sanierung WC's Trakt 0

Budget 140.000,-€ Erneuerung aller Oberflächen (Boden, Wände, Decken), Errichtung von Vorwandinstallationen, Austausch der Trennwände und Erneuerung der Toiletten, der Urinale und der Waschbecken. Erneuerung Teilbereich des Trinkwassernetz. Planer und Fachplaner sind beauftragt. Grundlagenplanung ist abgeschlossen. Die Ausschreibungen zur Ausführung der Leistungen befinden sich kurz vor der Veröffentlichung. Umsetzung ab Herbstferien.

4. Sanierung von zwei Naturwissenschaftsräumen und einem Vorbereitungsraum Trakt 0

Budget 600.000,-€ Erneuerung aller Oberflächen (Boden, Wände, Decken), Erneuerung der technischen Versorgung und der Einrichtung. Ausschreibung Planer abgeschlossen. Auftragserteilung diese Woche.

5. Fahrradstellplätze

Budget 30.000,-€ Erweiterung der Stellfläche für Fahrräder, Austausch der Fahrradständer und Überdachung eines Teilbereichs. Planer ist beauftragt. Die Grundlagenplanung ist abgeschlossen. Die Ausschreibung erfolgt in Kürze. Ziel: Umsetzung direkt nach den Sommerferien.

6. Einrichtung Divers-Umkleide + Dusche sowie barrierefreies WC. Teilsanierung Duschbereiche.

Budget 70.000,-€ Einrichtung einer Dusch- und Umkleidemöglichkeit für diverse Menschen. Einrichtung eines barrierefreien WC's. Planer und Fachplaner sind beauftragt. Die Grundlagenplanung ist erfolgt. Umsetzung nach finanzieller Möglichkeit nach Sporthalle und WC-Anlage.

7. Anpassung Trinkwassernetz

Budget 100.000,-€ Fachplaner ist beauftragt. Grundlagenplanung ist abgeschlossen. Die Ausschreibungen zur Ausführung der Leistungen befinden sich in Vorbereitung (in Abhängigkeit mit WC-Anlage).

8. Zusätzliche Trinkwasserstation Trakt 6, Mensa und GS/HS

Siehe Punkt 7.

9. Verwaltung/Lehrervorbereitung RS

Budget 30.000,-€

Gesamtsumme 1.970.000,-€

IGS Lengede



**Erweiterung mit Mensa und
8 AUR, Besprechung,
Anpassung im Bestand**


BGF = 1.541 m²

Kosten: 6,5 Mio €

Baubeginn: Juli 2021

Fertigstellung: Juni 2023

Sporthalle Lengede

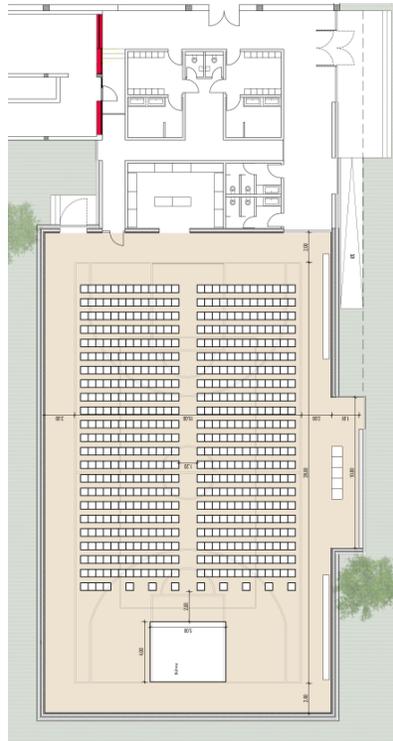

**1-Feld-Sporthalle mit
Multifunktionsnutzung
(Versammlungsstätte, 450 Sitzplätze)**

BGF = 1.039 m²


Kosten: 4.533.900 €

Baubeginn: Sommer 2024

Fertigstellung: Sommer 2025

(Umsetzung mit Sporthalle Vechelde)

Ratsgymnasium Peine

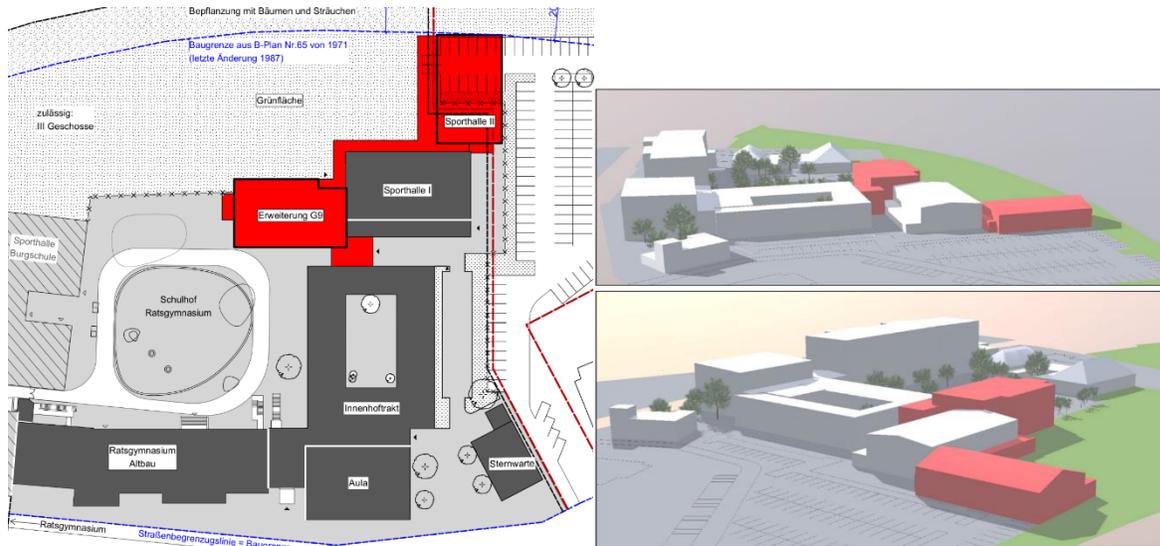

Erweiterung mit 8 AUR, neue Umkleiden und Duschräume, 1-Feld-Sporthalle


BGF = ca. 2.790 m²

Kosten: 7,5 Mio €

Projekt ist mit Schule abgestimmt, Entwurf und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung sind fertiggestellt
 Projekt ist weiterhin in Abstimmung mit der Stadt Peine wegen der Eigentumsverhältnisse.
 Gegebenenfalls will die Stadt sich wegen der Bedarfe der Burgschule am Projekt beteiligen.
 Baubeginn und Fertigstellung offen.

Projekt steht derzeit mit der genannten Planung.

Ratsgymnasium Peine

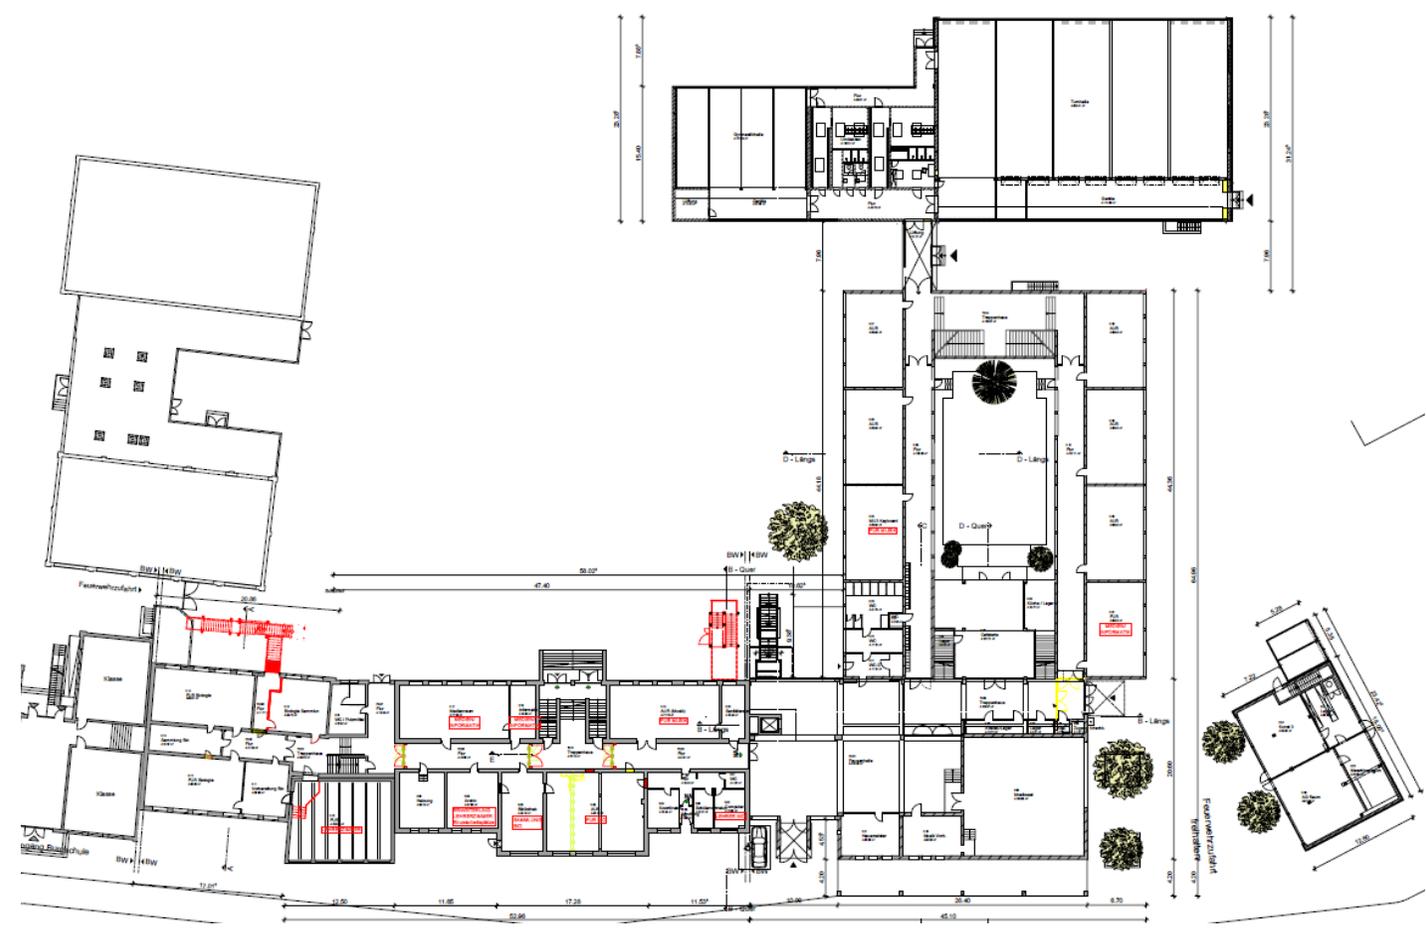

**Sanierung
Gebäudesubstanz,
Brandschutz und
Barrierefreiheit**

Budget aktuell: 300.000 €

Baubeginn: 2019

Fertigstellung: 2028


Sachstand: 2/3 des Gebäudes
sind ertüchtigt (ohne die
Sporthalle)

Gymnasium am Silberkamp



**Erweiterung mit 8 AUR,
Bücherei, Forum, Büro,
Anpassung im Bestand**
BGF = ca. 1.500 m²
Kosten: 8,8 Mio €
Baubeginn: Mai 2024
Fertigstellung: Juli 2025

Gymnasium am Silberkamp

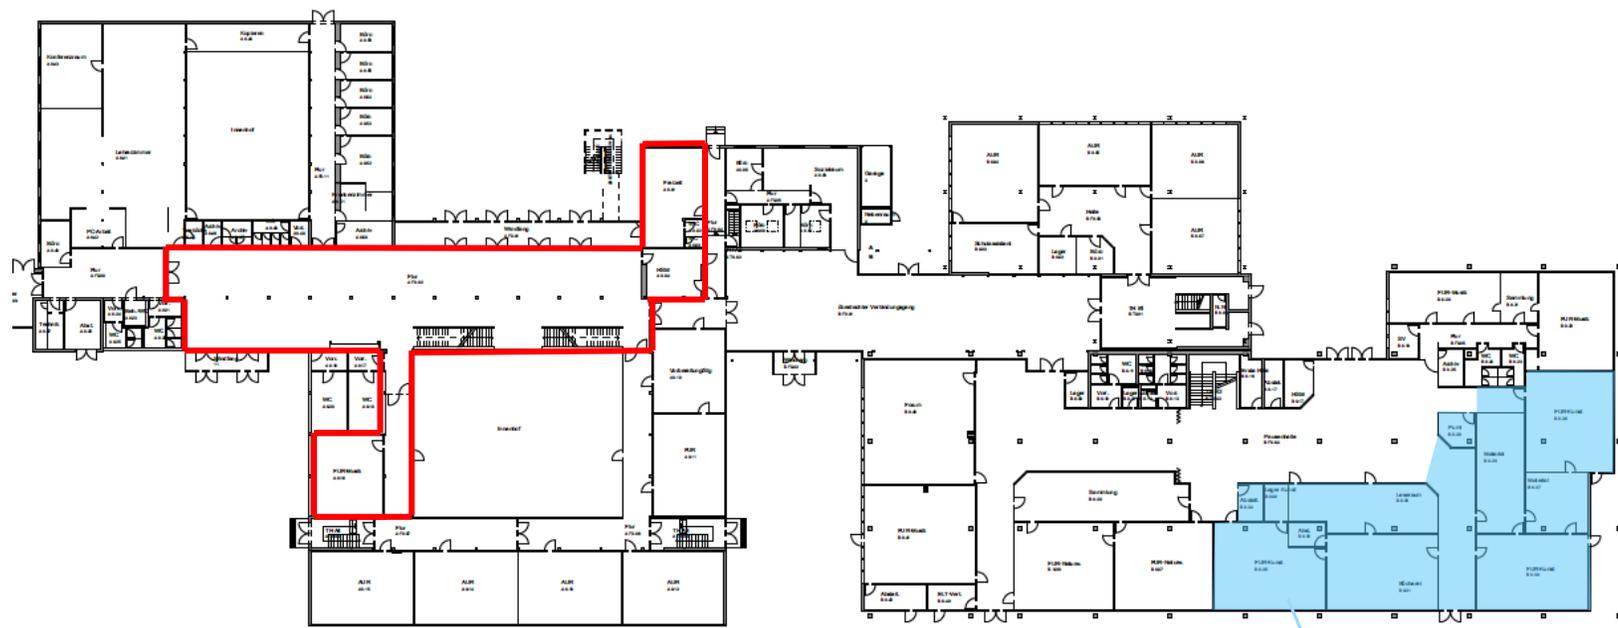


Sanierung
Bestandsgebäude, insb.
haustechnische
Infrastruktur, BMA und
Anschluss am Neubau
Budget aktuell: 1.795.000 €
Baubeginn: Mai 2024
Fertigstellung: Mai 2025
Sachstand: Maßnahme ist in
der Umsetzung

Umbau im Bestand
(im Zuge des
Neubaus)

NSHV

BBS Peine

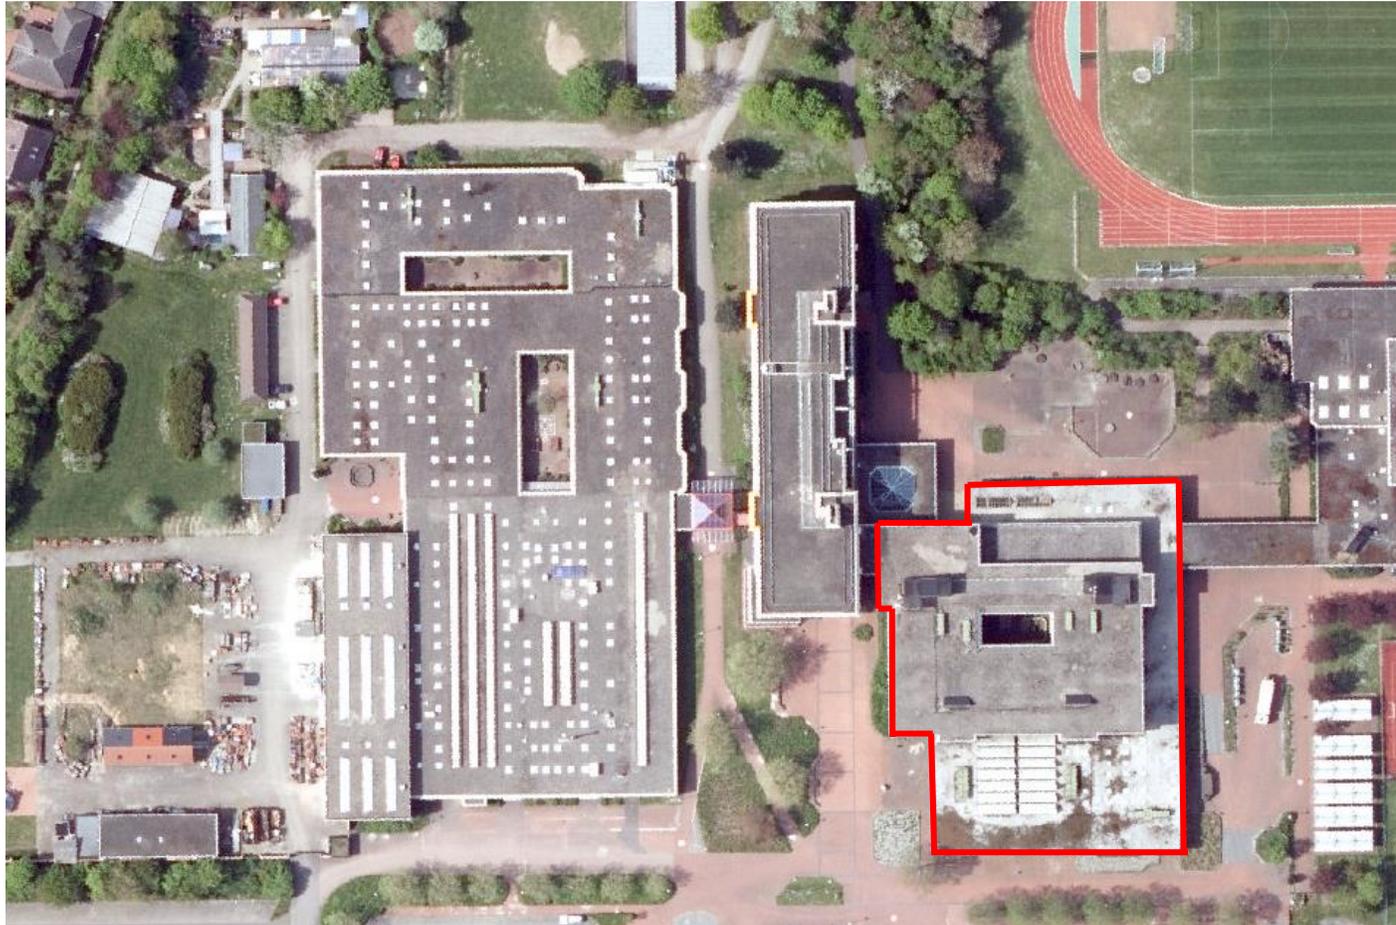

Sanierung BMA, Notbeleuchtung und Metaldecken


Budget aktuell: 910.000 €

Baubeginn: 2020

Fertigstellung: Oktober 2024

Sachstand: 80 % der
Baumaßnahme sind
abgeschlossen

JSG Vechelde

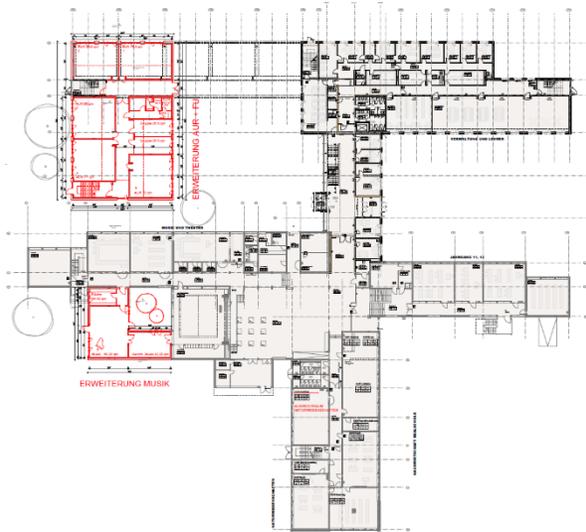

**Erweiterung mit 7 AUR, 2
EDV-Räume,
Gruppenräume, Musik-
und Bioraum, Anpassung
im Bestand**

BGF = 1.722 m²


Kosten: 8,2 Mio €

Baubeginn: Anfang 2023

Fertigstellung: Herbst 2023

(Fertigstellung Sommer
2024)

Sporthalle II Vechede

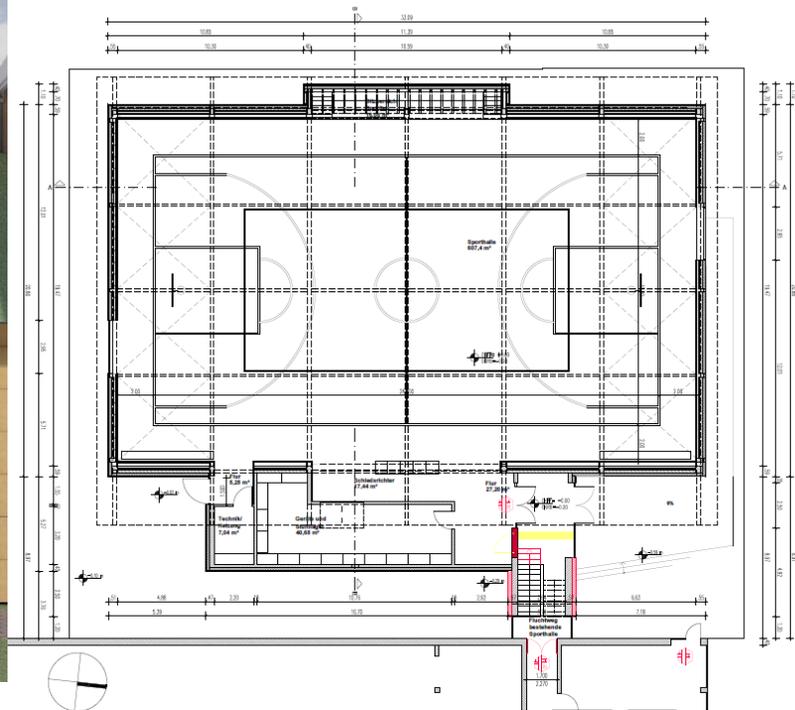

1-Feld-Sporthalle

BGF = 801 m²


Kosten: 3.308.200 €

Baubeginn: Sommer 2024

Fertigstellung: Sommer 2025

(Umsetzung mit Sporthalle Lengede)


Realschule Vechelde

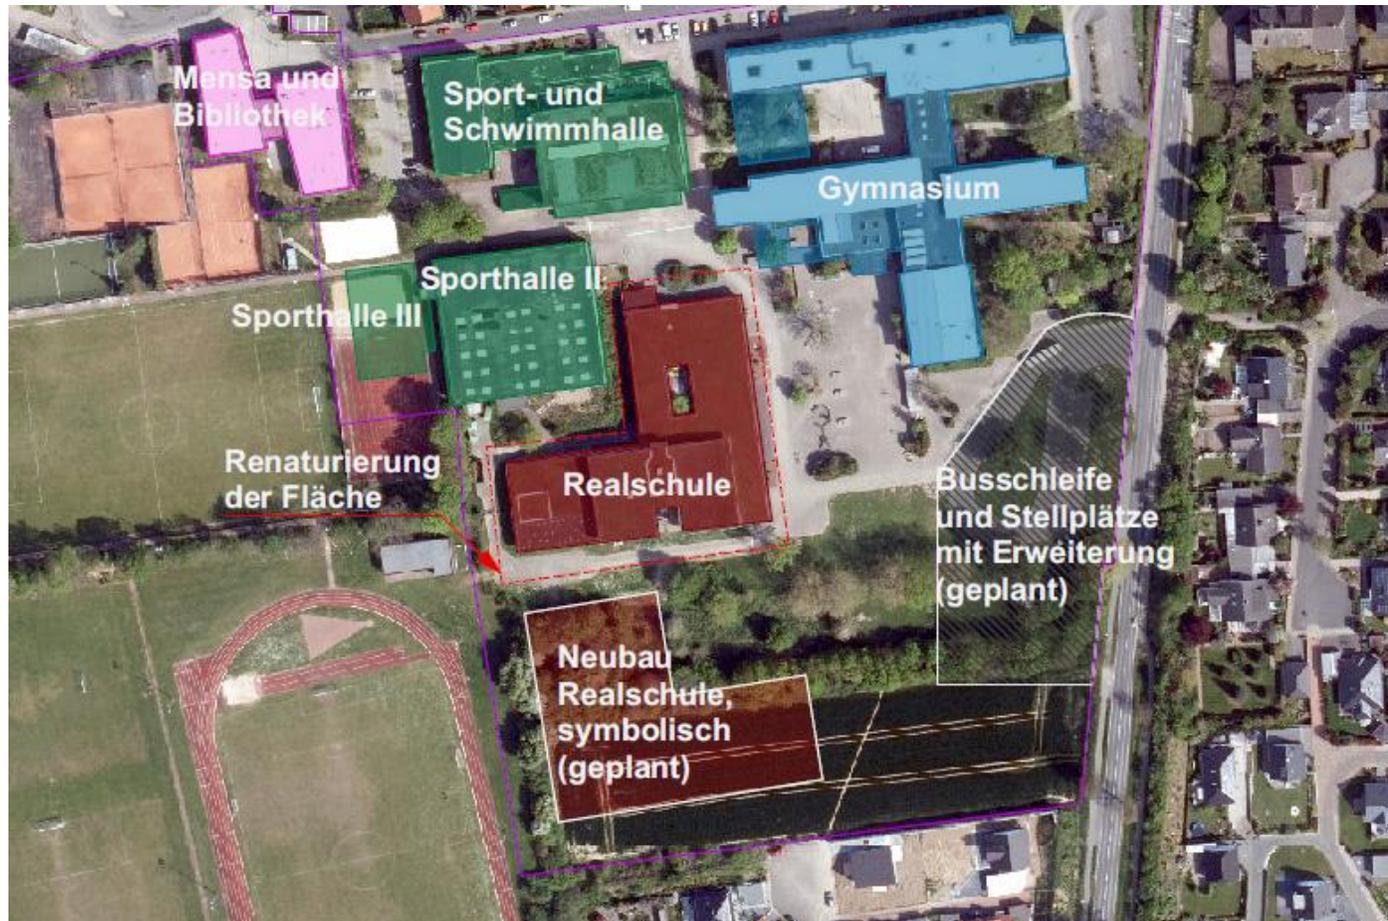

Neubau Schulgebäude

- Erstellung Raumkonzept 2024
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 2025
- Ausschreibung, Verhandlungsverfahren, Vergabe 2026
- baul. Umsetzung 2027-2028

HS/GS Vechede

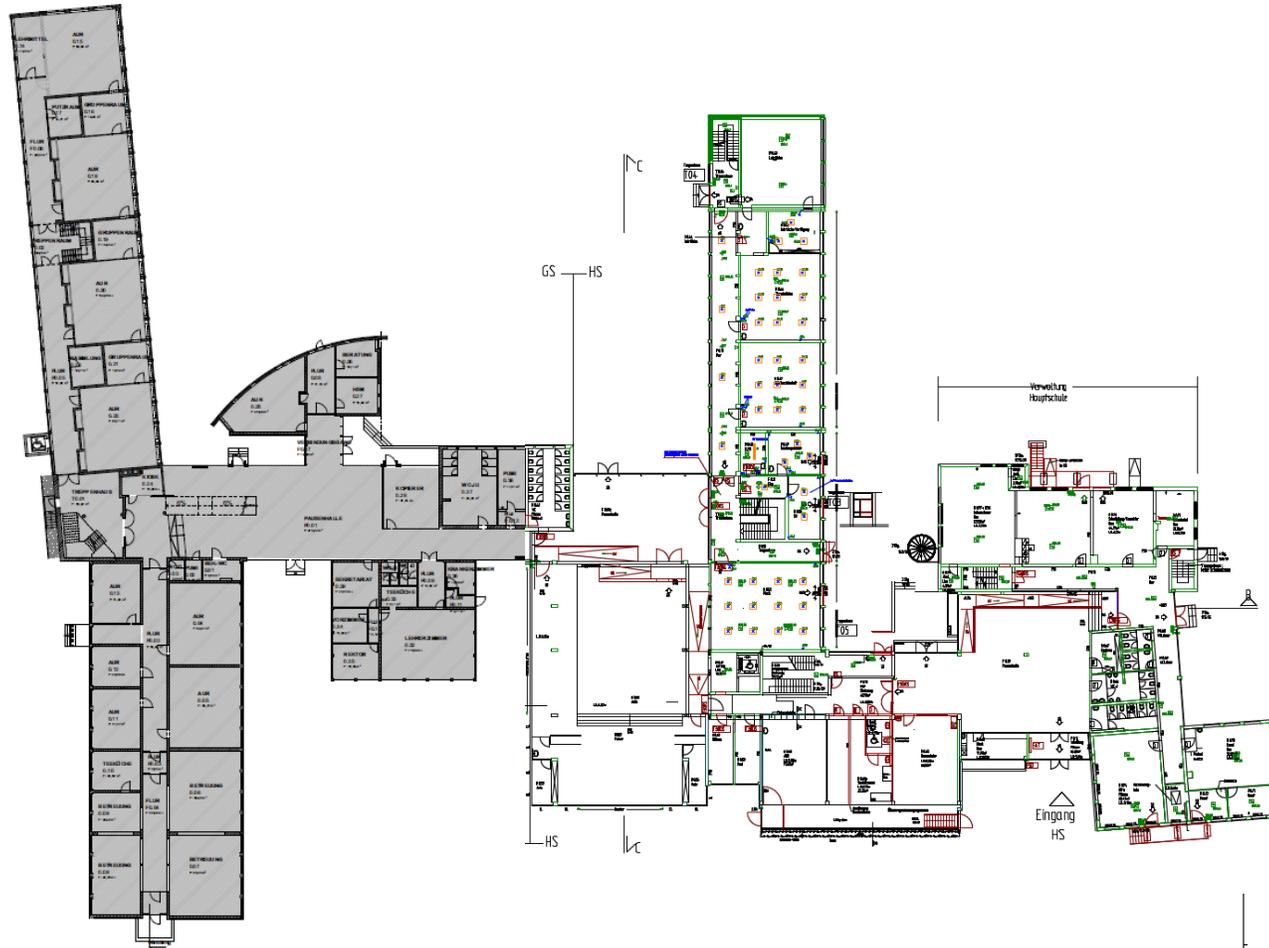

Sanierung Brandschutz und Blitzschutz


Budget: aktuell 180.000 €

Baubeginn: 2014 (Brandschutz)

Fertigstellung: Februar 2023

Sachstand: Brandschutz ist abgeschlossen, Blitzschutz ist in Planung

Sporthalle I Vechede

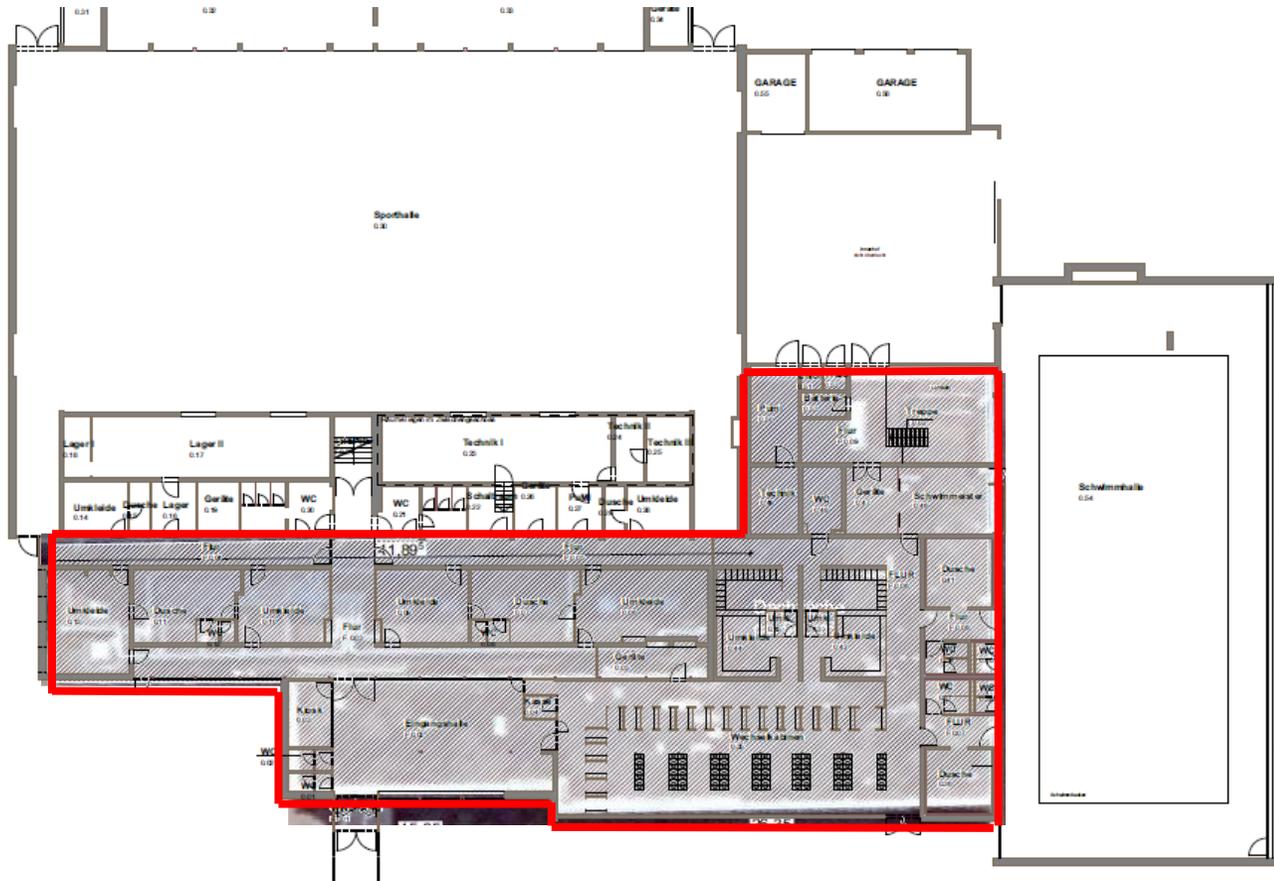

Sanierung Dach und Decke Umkleide

Budget: aktuell 400.000 €

Baubeginn: August 2024

Fertigstellung: Dezember 2024

Sachstand: Ausschreibung Planer
im Mai 2024
